

BV: Neubau einer Hochspundwand am Containerterminal im Hafenbecken 1 in Gernsheim am Rhein

Beseitigen von Bohrhindernissen, insbesondere Durchkernen von Bohrpfählen der Uferbefestigung, als Vorbereitungsmaßnahme für die späteren Spundwandarbeiten

Bauherr: Gernsheimer Hafengesellschaft mbH
Auftraggeber: Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG
Ausführungszeit: 05/2015


05/2015

Leistung:

Räumbohrungen mit einem Durchmesser von 120 cm
einschließlich Verfüllung mit nichtbindigem Material

Anzahl: 77 Stück

Effektive Bohrstrecke ab Hafensohle: 4,50 bis 7,00 m

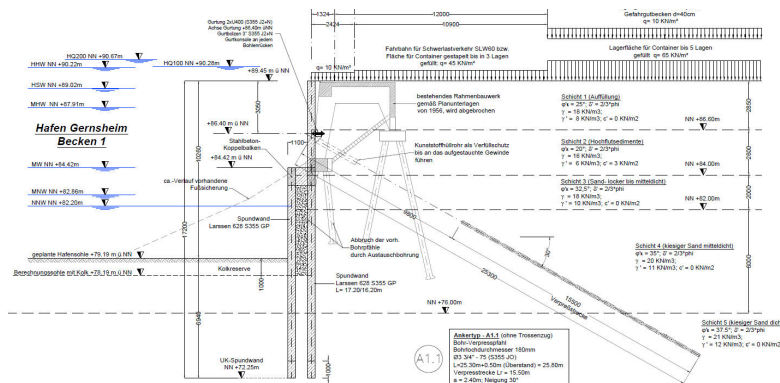

Gerätetechnik:

Drehbohrgerät Bauer BG20H

Besonderheiten:

Die Arbeiten wurden von einem Ponton der Firma Hülskens aus durchgeführt. Damit verbunden sind besondere Ansprüche an die Arbeitssicherheit und beengte Platzverhältnisse.

